


DGTEC - EsPro

Portfólio de Projetos 2019



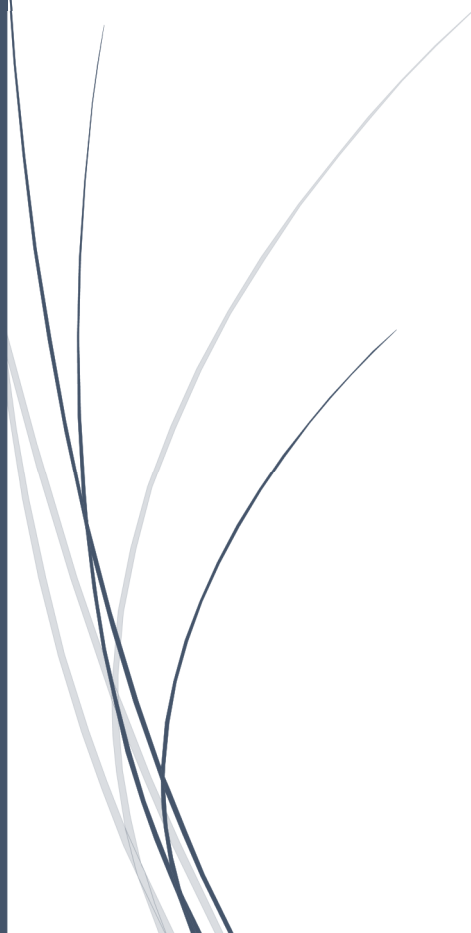

Sumário

1. Portfólio de projetos acompanhados pelo EsPro.....	2
2. Distribuição dos projetos por classe.....	6
3. Distribuição dos projetos por departamento.....	6
3.1. Situação atual dos projetos do DESIS.....	7
3.2. Situação atual dos projetos do DEATE.....	9
3.3. Situação atual dos projetos do DEINF.....	11
3.4. Situação atual dos projetos do ASGES.....	11

1. Portfólio de projetos acompanhados pelo EsPro

Nº do Projeto	Nome do Projeto	Classificação do Projeto	Status	Gerente de Projetos	Início	Encerramento
30220	Desenvolvimento de Relatórios e Indicadores na nova ferramenta de BI	Prioritário	Planejamento	Danusa Coelho	Out/14	TBD
30229	Substituição do SHS pelo SCOL	Prioritário	Planejamento - Análise e Documentação de Requisitos	Roberto Nunes	Nov/14	TBD
30260	Ampliação do Processo Eletrônico Judicial (continuação) - PE 07	Estratégico	Implantação	Maria Eugenia Borges	Jun/15	Out/2020
30261	Aperfeiçoamento do Sistema de Sessão Eletrônica	Prioritário	Planejamento - Análise e Documentação de Requisitos	Claudio Viana	Mai/15	TBD
30280	Novo sistema GPES	Prioritário	Execução	Aline Viana Magalhães	Jun/15	Set/20
30281	Aquisição de Tecnologia - Sistema de Gestão de Saúde	Prioritário	Planejamento - Análise e Documentação de Requisitos	Aline Viana Magalhães	Jun/15	TBD
30369	Visualizador do PJERJ	Prioritário	Homologação	Marco Monteiro	Jul/15	Jun/19
30393	Protesto no Sistema de Cobrança - ArrecadaWeb	Prioritário	Execução	Rodrigo Meireles Soares	Out/14	Ago/19
30399	Webservice PGM - DARM Compartilhado Banco do Brasil	Prioritário	Execução	Cleiver Carvalho	Mar/15	Ago/19
30426	Fluxo da Dívida Ativa	Prioritário	Planejamento	William da Luz Telles	Ago/15	TBD
31033	Migração dos sistemas MUMPS da DIADD	Prioritário	Execução	Flavio Vazquez	Fev/16	TBD

Acompanhamento do Portfólio de Projetos.
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC
Escritório de Projetos - EsPro

31034	Migração dos sistemas Mumps da SEHAC	Prioritário	Execução	André Luís Faruolo França	Fev/16	TBD
31480	DNA WEB	Prioritário	Execução	Claudio Viana	Fev/17	TBD
31653	Melhorias dos sistemas do DEPAM	Prioritário	Execução	Douglas Blanc	Fev/17	Mai/19
31654	Classificação de despesas	Prioritário	Homologação	Roberto Nunes	Fev/17	Mai/19
31655	Desenvolvimento do sistema SISTRANSP	Prioritário	Execução	Douglas Blanc	Fev/17	Set/19
31656	SISLIC	Prioritário	Implantação	Douglas Blanc	Fev/17	Mai/19
31657	Custas GRERJ & SMR	Prioritário	Homologação	Claudio Blanco	Fev/17	Jul/19
31658	Custas no DCP	Prioritário	Homologação	Claudio Blanco	Fev/17	Jul/19
31713	Custas no SCJ	Prioritário	Homologação	Claudio Blanco	Fev/17	Jul/19
31839	Fluxo dos Juizados Fazendários	Prioritário	Execução	William da Luz Telles	Set17	TBD
31864	PIE CR- Petição Eletrônica no CR	Prioritário	Execução	Moises Sardenberg da Rocha	Ago/17	Ago/19
31880	Atualização do Parque Tecnológico (continuação) - PE 21	Estratégico	Planejamento	Marcelo Pia de Oliveira Costa	Abr/17	Dez/20

Acompanhamento do Portfólio de Projetos.
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC
Escritório de Projetos - EsPro

31923	Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos Juizados Especiais Cíveis	Prioritário	Execução	William da Luz Telles	Ago/17	Dez/20
31924	E- Social	Prioritário	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Victor de Alencar Jesus	Fev/17	Jan/20
32045	Sistema EMERJ	Prioritário	Execução	Rodrigo Meireles	Dez/17	Ago/19
32047	Gabinete WEB	Prioritário	Execução	Natalie Mussi	Nov/17	Jun/19
32073	APP dos Advogados/Partes	Prioritário	Execução	Moisés Sardenberg	Jan/18	Ago/19
32108	PROJUDI– 3ª Fase	Prioritário	Execução	Simone de Almeida	Ago/16	TBD
32162	Sistema Tutoria Judicial	Prioritário	Implantação	Nadia Cristina de Araujo	Jun/18	Jun/19
32163	Plantão Judicial Eletrônico	Prioritário	Execução	Maria Eugênia	Ago/18	Jun/19
32323	Fluxo JEC - 2ª fase	Prioritário	Execução	William da Luz Telles	Ago/18	Jun/19
32327	BNMP2.0 - 2ª Instância	Prioritário	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	André Faruolo França	Set/18	TBD
32328	Novo Portal dos Advogados/Partes	Prioritário	Execução	Moises Sardenberg da Rocha	Ago/18	Ago/19
32330	Servidor Elasticsearch - Indexação Jurisprudencia e DJE	Prioritário	Implantação	Moises Sardenberg da Rocha	Set/18	Mai/19
32331	Justiça Digital	Prioritário	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Moises Sardenberg da Rocha	Out/18	TBD

Acompanhamento do Portfólio de Projetos.
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC
Escritório de Projetos - EsPro

32372	Super Sigilo	Prioritário	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	André Faruolo França	Dez/18	Jun/19
32373	App do GabineteWeb	Prioritário	Execução	Natalie Mussi	Jan/19	Jun/19
32402	Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE	Estratégico	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	André Gurgel	Nov/18	Dez/22
32403	Novo Sistema de Cobrança	Prioritário	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Claudio da Costa Blanco	Jan/19	Dez/20
32404	Sistema ERP da DGPCF	Prioritário	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Rodrigo Meireles Soares	Dez/18	Jan/20
32405	Implantação do Novo Sistema de Processo Administrativo Eletrônico – SEI	Estratégico	Implantação	Virna Amorim	Set/18	Jun/19
32406	Migração do PROJUDI para o sistema SEEU	Prioritário	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Simone de Almeida Araújo	Dez/18	Dez/20
32407	Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos	Estratégico	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Ivan Lindenberg JR	Abr/19	Dez/20
32408	Estudo para solução de contingência de infraestrutura de TIC	Estratégico	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Renato Warwar	Abr/19	Dez/20
32492	Automação Dashboard Governança TIC	Prioritário	Planejamento - Controle do Planejamento do Projeto	Moises Sardenberg da Rocha	Abr/19	Dez/20

2. Distribuição dos projetos por classe




Legenda

Estratégico (PE): É aquele que está relacionado a um tema ou a um dos focos estratégicos definidos no plano estratégico do PJERJ e incluídos no seu portfólio de projetos estratégicos. Como os recursos (financeiros e humanos) são sempre escassos, estes deverão ter prioridade de execução.

Prioritários (PP): É aquele que está relacionado a um dos objetivos estratégicos da DGTEC e que tenha sido formalmente priorizado pelo diretor da DGTEC.

3. Distribuição dos projetos por departamento

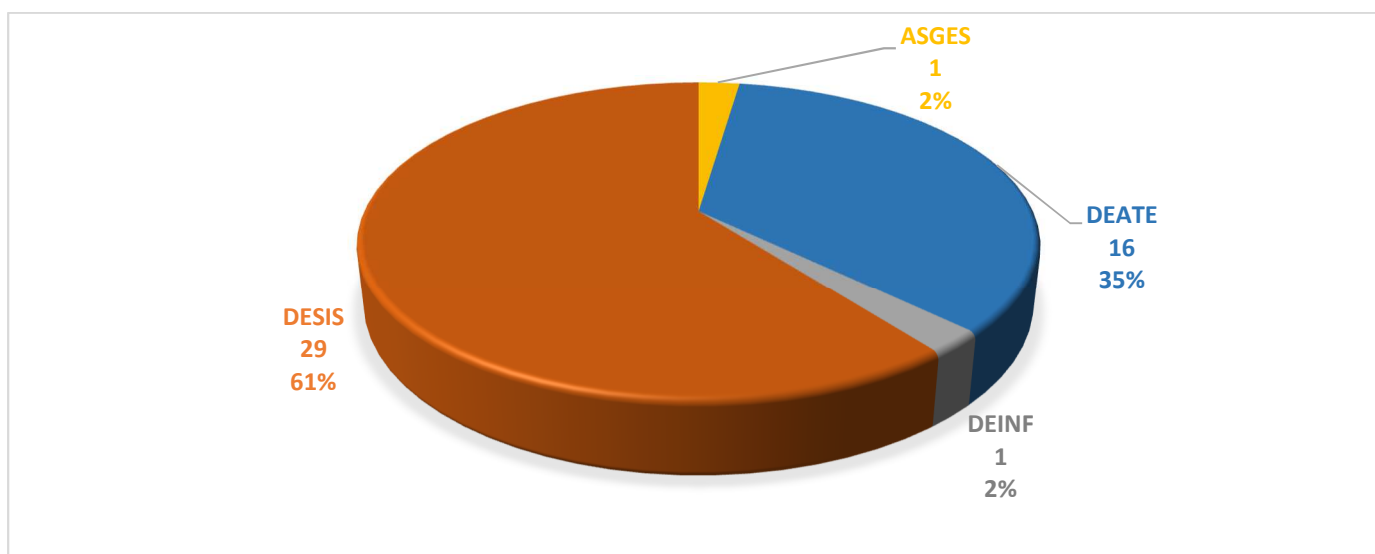

3.1. Situação atual dos projetos do DESIS

PP - 30220 - Relatórios e indicadores de BI: Realizada a primeira etapa da Prova de Conceito (Poc) da ferramenta Cognos. Após a realização dos testes, concluímos que o Cognos TM1 não atende. Sendo assim, não será realizada a segunda etapa em que seriam analisadas questões de performance e volumetria. Agendada apresentação da ferramenta de BI (Qlik) e da ferramenta Microsoft Power BI, após será feita uma Poc com cada uma das ferramentas para análise.

PP - 30229 - Substituição do SHS pelo SCOL: Aguardando aprovação de custo da REQ2015.0013233 - PF =761,8 . Atraso na substituição do sistema MUMPS. Aguardando aprovação custo pelo CGTIC.

PP - 30280 - Novo sistema GPES: Empresa sinalizou novo prazo final para Setembro/2020 e caso a CTIS não renove o contrato em setembro/2019, há o risco de não entrega do projeto. Todas as atividades estão com atraso se considerarmos o prazo inicial final NOVEMBRO/2018. Projeto redivido em 4 frentes devido a diminuição de recursos de GP: 1ª Frente (SERVIDORES) - Estão em fase de testes nas funcionalidades de Cargo de Confiança e Cadastro de Servidores, priorizadas pela DGPEs, previstas para serem entregues em junho de 2019; 2ª frente (MAGISTRADOS) - Cadastro de Magistrados: previsão de entrega para junho/2019, junto com Cadastro de Servidores; 3ª Frente (AUXILIARES JUSTIÇA)– Esta frente engloba a entrega de 3 sistemas: UNIV-WEB (7 módulos e apenas o primeiro módulo (Financeiro) está com a previsão de entrega para até setembro/2019, os outros estão previstos para Outubro/2019 a Junho/2020), JUIZ de PAZ (previsão de entrega é para julho/2019 e CONCILIADOR (previsão de entrega é para julho/2019); 4ª Frente (BENEFÍCIOS)– Até o momento foram entregues: 30% do Módulo Auxílio Educação; 55% do Módulo Auxílio Pré-escolar; 65% do Módulo Auxílio Saúde. Próximas entregas: Auxílio Pré-Escolar: previsão de entrega para abril/2019; Auxílio Saúde: previsão de entrega para maio/2019; Auxílio Educação : previsão de término em junho/2019.

PP - 30281 - Aquisição - Gestão de Saúde: Proc. 2018.0233073 - dia 18/03/2019: a DGTEC-CONTRATOS encaminha à DGPES/ASSESSORIA TÉCNICA os presentes autos conforme solicitado para as providências pertinentes. Após pela devolução a esta DGTEC/Assessoria de Contratos. Movimento anterior: Ao DESAU Encaminho ao DESAU para que providenciem a pesquisa de mercado, analisem, assinem e rubriquem os estudos preliminares e o termo de referência, devendo retornar a esta Assessoria de Contratos até 13/03/2019 conforme cronograma de fls. 13 para prosseguimento.

PP - 30369 - Visualizador do PJERJ: Nova data de entrega do projeto prevista para Junho/2019, juntamente com o Novo Portal e GabineteWeb, com a versão MAVENFLIP. Aguardando alterações solicitadas: REQ2018.0131498 - MPS e REQ2018.0122703 e REQ2018.0164887 - Stefanini: levantamento preliminar.

PP - 30399 - Webservice PGM - DARM compartilhado Banco do Brasil: Aberta REQ2019.0017810 para implementação de itens não avaliados inicialmente, sem data prevista para entrega pela CTIS, em fase de levantamento preliminar . Projeto em atraso, devido a mudanças do layout da webservice pela PGM.

PP - 31033 - Migração dos sistemas do DIADD: Aguardando cronograma com informações sobre os sistemas pendentes de migração. Atrasos pela CTIS no cumprimento dos prazos acordados.

PP - 31034 - Migração dos sistemas do SEHAC: Aguardando cronograma com informações sobre os sistemas pendentes de migração. Atrasos pela CTIS no cumprimento dos prazos acordados

PP - 31653 - Melhorias dos sistemas do DEPAM: Projeto com 10 Requisições entregues, aguardando o desenvolvimento da última REQ 2018.0073274 , que ainda está sem previsão de entrega pela CTIS.

PP - 31654 - Classificação de despesas: Implantação em 26 de abril/2019, mas ainda com erros sendo corrigidos. Previsão final maio/2019.

PP - 31655 - Desenvolvimento do sistema SISTRANSP: Cadastros e Gestão de Estoque – março de 2019 (homologado, mas não funciona em produção – empresa verificando com DGTEC/DEINF); Ordem de Serviço e Solicitação de Peças



Acompanhamento do Portfólio de Projetos.
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC
Escritório de Projetos - EsPro

– maio de 2019 (iniciando homologação parcial); Leilão de Viaturas – junho de 2019 (em teste pós-alterações); Solicitação de Transporte – agosto de 2019 (em desenvolvimento); Pesquisa de Satisfação – agosto de 2019 (em homologação); Relatórios – agosto de 2019 (em desenvolvimento).

PP - 31656 - SISLIC: Aguardando implantação conjunta nos sistemas SIRS, SISCAN e SISLIC de 8 Requisições. Previsão final maio/2019.

PP - 31657 – Custas GRERJ e SMR: Programa de Custas : 1ª Fase - Sistema SMR homologado. Sistema Grerj Eletrônica em homologação. Aguardando término dos testes unitários e integrados envolvendo todos os sistemas judiciais (DCP, eJUD e PROJUDI). Reunião de apresentação da Grerj Eletrônica para o DEGAR e para a Divisão de Custas (CGJ/DICIN) realizada em 17/04/2019, em que foram solicitadas alterações consideradas fundamentais para a implantação do sistema. Novas alterações nos sistemas SMR e Grerj Eletrônica.

PP - 31658 - Custas no DCP: Programa de Custas : 1ª fase - Vinculação da GRERJ inicial e intercorrente - data prevista em maio/2019; 2ª Fase - (Unificação tabelas SMR, DCP) e 3ª fase - Certidão Débito sem data prevista de entrega.

PP - 31713 - Custas no SCI: Programa de Custas: 1ª fase - Vinculação da GRERJ inicial e intercorrente - data prevista em maio/2019; 2ª Fase - (Unificação tabelas SMR, DCP) e 3ª fase - Certidão Débito sem data prevista de entrega.

PP - 31864 – PIE CR- Petição Eletrônica no CR: Projeto será implantado junto com o Novo Portal. Os serviços estão sendo desenvolvidos pela FSW com previsão de entrega em agosto/2019.

PP - 31924 - E- Social: Projeto dividido em 3 fases: Fase 1 (Evento tabelas e empregador) – término previsto 30/04/2019- Fase Atual: Em aprovação de Casos de Uso - Fase 2 (Evento trabalhador e não periódicos)- término previsto 31/07/2019 – Fase Atual: Em elaboração de Documento de Entendimento Fase 3 (Evento periódicos) - término previsto 31/10/2019 - Fase Atual : Não Iniciado. Novo calendário oficial de entrega do e-social foi alterada para Janeiro/2020 e o REINF para janeiro/2021.

PP - 32047 – Gabinete WEB: A primeira reunião de aprovação dos sprints foi realizada em 23/02/2018. Todas as atividades que faltam para finalizar o projeto estão em atraso. Relatórios Gerenciais (alguns), melhorar a experiência do usuário, módulo Movimentação, módulo Assinatura, módulo Audiência, atualização que equipara o Gabinete Web com o DCP, alterações solicitadas em reunião, correções de erros identificados. Novo prazo previsto para Junho/2019.

PP - 32073 - APP dos Advogados/Partes: Projeto deve ser entregue junto com o projeto NOVO PORTAL ADVOGADOS/PARTES – STEFANINI. Desenvolvimento das funcionalidades de 2ª instância já finalizados e os serviços de 1ª instância estão em testes pela MPS. Aguardando definição da data de liberação de protótipo para homologação DEATE. Previsão final Julho/2019.

PP – 32327 – BNMP2.0 – 2ª Instância: Novo projeto para implementação do BNMP2.0 na 2ª Instância nos moldes implementados na 1ª instancia. 3 Reqs. (MPS) e 1 Req. (Stefanini) para implementação. Ainda sem previsão de entrega final.

PP – 32328- Novo Portal dos Advogados/Partes: Projeto deve ser entregue junto com o projeto APP PORTAL ADVOGADOS/PARTES – MPS. Os serviços de 1ª instância foram disponibilizados para a MPS iniciar o desenvolvimento e testes integrados em março/2019. A versão 1.0 com os itens consulta, histórico, indisponibilidade e o legado será liberada para testes do DESIS em abril/2019. A parte da Distribuição e Petição Inicial tem previsão de entrega para testes em julho/2019. Previsão final Julho/2019.

PP – 32330 – Servidor ElasticSearch – Indexação Jurisprudência e DJE: Projeto em fase final de homologação. MPS encaminhou ao DEATE os casos de usos e contagem PF para aprovação. A parte do DJE aguarda-se aprovação pelo demandante e finalização dos testes pela CTIS para disponibilizar em produção. Prazo final maio/2019.

PP – 32331 – Justiça Digital: Aguardando a Análise de viabilidade da solução técnica encontrada pela Vertigo para aprovação de cronograma e custos pelo demandante. Sem previsão de entrega final.

PP – 32372 – Super Sigilo: Projeto que engloba desenvolvimento em 3 sistemas – eJUD, DCP e Portal. Total de 13 Requisições, 8 já em produção: REQ2018.0089573 (MPS) – Aguardando aprovação LR desde 06/02/2019.

Acompanhamento do Portfólio de Projetos.
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC
Escritório de Projetos - EsPro

REQ2018.0069998 / REQ2018.0170778 / REQ2018.0097694 (STEFANINI) – Aguardando disponibilizar novo Caso de Uso; REQ2018.01364527 (STEFANINI) – Em levantamento. Prazo previsto Junho/2019.

PP – 32373 – App do GabineteWeb: Projeto deve ser entregue junto com o Projeto GabineteWeb, engloba CTIS, MPS e Vertigo. Após reunião de alinhamento em 04/04/2019 com a Stefanini, MPS, GP Moisés a Vertigo está fazendo a análise do código fonte passado e o orçamento do esforço. Aguardando definição de prazos e valores a serem aprovados pelo Juiz Auxiliar Dr. Fabio Porto.

PE – 32402 - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE: Projeto de implantação do sistema judicial com previsão de termino em 2020, sendo que o piloto será entregue em 2020, nas competências Juizados, Dívida Ativa e Turmas Recursais. Aguardando cronograma, detalhamento e projeto executivo.

PP – 32403 – Novo Sistema de Cobrança: Fase atual: Levantamento Preliminar – não houve qualquer implantação. Cronograma apresentado finaliza em 12/2020, todavia ainda não foi definido formalmente o que a empresa entregará até o final do contrato atual (09/2019). Adoção do método “Ágil” de desenvolvimento, o que permitirá, entre outras coisas, uma verificação das telas do sistema ao longo do processo de desenvolvimento, e não somente na fase de homologação (solicitação dos usuários).

PP – 32492 – Automação Dashboard governança TIC: Levantamento dos requisitos (Verificar o que pode ser automatizado da Query enviada pelo EsPro). Aguardando instalação do Gateway, para viabilizar a comunicação dos sistemas internos com o DASHBOARD. Aguardando Reunião sobre DEVOPS.

3.2. Situação atual dos projetos do DEATE

PE - 30260 - Ampliação do Processo Eletrônico Judicial: Foram implantadas todas as competências (85%) restando para a finalização do projeto a competência criminal. Já foram implementadas as varas: Vara Criminal e Juizado Criminal e de Violência Doméstica de Maricá e 1ª Vara Criminal de Niterói, em 2018, como pilotos. Para a expansão nas demais serventias foram abertas requisições de adequação: REQ2018.0004099 – Possibilitar a distribuição pela polícia civil de processos de medidas sigilosas eletrônicas – Dr. Fabio e Dra. Daniela concordaram que isso entre ano que vem. Por enquanto serão distribuídos fisicamente; REQ2018.0136424 – Ao juntar a Petição do Tipo Denúncia encaminhada pelo Ministério Público a mesma deverá passar a ser a primeira peça na árvore do processo – Em produção na versão de 24/04/2019 (erro ao realizar o procedimento em produção, analista já está verificando); REQ2018.0169715 - Possibilitar ao juiz ouvir as audiências gravadas no Kenta em processos relacionados. – Levantamento junto a equipe do Kenta; REQ2018.0171406 - juntada automática das petições da defensoria com alteração do local virtual. – Em testes. Previsão de finalização do projeto em Outubro /2020.

PP - 30261 - Aperfeiçoamento do Sistema de Sessão Eletrônica: Aguardando definição DGTEC e SETOE sobre a utilização do sistema SEV-MPRJ, sobre outro sistema de votação utilizado em Tribunais, ou mesmo sobre o desenvolvimento de um sistema próprio que atenda às necessidades do TJERJ. Sem previsão de prazo final.

PP - 30393 - Protesto no sistema de Cobrança – Arrecada WEB: Aguardando finalização do desenvolvimento nos sistemas DCP, PROJUDI, EJUD e ArrecadaWeb para finalização do projeto. Será realizada reunião em maio/2019 para planejar a homologação integrada e previsão da disponibilização da funcionalidade nos sistemas em produção.

PP – 30426 - Fluxo da dívida ativa: A 1ª fase com integração ao Correios foi entregue em outubro/2018 no sistema DCP. Faltam 3 fases que ainda estão sem definição de prazo. Com o projeto de implantação do PJE este projeto está sendo reavaliado sobre continuidade, e será analisado se a implementação será feita no DCP – sistema atual – ou será implementado em conjunto com o PJE em 2020.

PP – 31480 - DNA WEB: Projeto paralisado na diretoria anterior. A nova diretoria irá agendar, a partir de junho/2019, reunião para alinhamento dos requisitos e definição da retomada ou não do projeto.

Acompanhamento do Portfólio de Projetos.
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC
Escritório de Projetos - EsPro

PP- 31839 - Fluxo dos Juizados Fazendários: Projeto dividido em 3 Sprints: O Sprint 1 foi entregue em 12/12/2017; Sprint 2 – Em produção a parte da distribuição desde 24/04/2019, mas houveram erros que estão sendo corrigidos pela Stefanini. A parte da petição está em testes com previsão de entrega em 09/05/2019. A parte da conclusão ainda em desenvolvimento sem data de entrega; Sprint 3 – Em fase de revisão dos requisitos pela FSW (Audiência e Recurso). Prazo final previsto maio/2019.

PE - 31880 - Atualização do Parque Tecnológico: Projeto em continuidade. Aguardando PGP e cronograma atualizado pelo GP.

PP - 31923 - Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos Juizados Especiais Cíveis: Projeto em continuidade: REQ2016.0012888 - ARQGER , REQ2017.0099111 - DCP ,REQ2018.0146297 / REQ 2018.0146312 e REQ 2018.0146318 - Portal. As requisições foram paralisadas pela Stefanini a pedido do usuário devido a mudança na administração, que alterou o escopo. Atraso nas entregas pela FSW atrasou a entrega do projeto em mais de 3 anos. Reunião de alinhamento de requisitos em maio/2019 para andamento do projeto.

PP - 32045 - Sistema EMERJ: Projeto em continuidade com previsão de finalização em agosto/2019. Alterações solicitadas em 8 Sistemas. 3 Requisições entregues até 23/03/2019. 3 Requisições em fase inicial de levantamento e 2 Requisições em desenvolvimento. 2 Requisições ainda não iniciadas. Sem cronograma das entregas pela FSW.

PP – 32108 - PROJUDI – Fase 3: Projeto com reuniões quinzenais da VEP com o DEATE, em continuidade, ainda sem previsão de entrega final e priorização da administração biênio 2019-2020 devido ao Projeto SEEU que prevê a troca do sistema da VEP. Foram abertas requisições que estão pendentes de desenvolvimento e priorização (24 até o momento).

PP - 32162 –Sistema Tutoria Judicial: Total de 18 Requisições no escopo do projeto: 8 Reqs entregues em 30/10/2018; 4 Reqs. entregues em 27/02/2019; 4 Reqs. entregues em 20/03/2019. Aguardando 2 Req em acultramento e desenvolvimento. Previsão de entrega final em junho/2019.

PP- 32163 – Plantão Judicial Eletrônico: Ficou deliberado que a implementação do plantão judiciário eletrônico ocorrerá no início do mês de junho de 2019, sendo que o único entrave para a implementação mais antecipada seria com o webservice de integração com o sistema da Polícia. Das 12 REQS abertas, 3 estão em homologação DEATE e TI Policia Civil e 1 em desenvolvimento FSW ,1 em levantamento inicial, 1 aguardando aprovação UC e 6 entregues aguardando implantação conjunta.

PP – 32323 – Fluxo JEC – 2ª Fase: Nova listagem de implementações com previsão final para junho/2019. Apesar das alterações solicitadas pelos usuários chaves terem sido entregues em fev/2019 foram reportados diversos erros (principalmente no controle de prazo). Em paralelo, foi feito pelo DEATE/STEFANINI uma verificação de todo o fluxo entregue, para validação com o escopo do projeto, que foi paralisado devido a falta de recursos da FSW. No momento a prioridade é a correção de todos os erros sinalizados até o momento, sem previsão de entrega pela FSW.

PP – 32404 – Sistema ERP da DGPCF: Foi finalizada em 29/03/2019 a etapa de instalação do GRP em ambiente HML e feito o setup do banco de dados. Início dos testes de balanceamento com o BIGIP ainda em andamento. Aguardando o cronograma previsto para 15/04/2019, pois a empresa está mapeando os processos e aguardando a liberação definitiva dos ambientes. A THEMA ainda não encaminhou o projeto de implantação junto com o cronograma. O prazo é 03/05/19.

PE – 32405 - Implantação do Novo Sistema de Processo Administrativo Eletrônico – SEI: Implantação do sistema SEI com prazo final junho/2019. Mesmo com os processos mapeados e acessos liberados algumas diretorias gerais ainda não começaram a utilizar o SEI. Cronograma sendo cumprido conforme demanda das diretorias.

PP – 32406 - Migração do PROJUDI para o sistema SEEU: Projeto em fase inicial de planejamento. Já foi feita Liberação do ambiente pelo CNJ, para os testes pelo PJERJ. Feitos questionamentos ao CNJ sobre infraestrutura, integração, documentação, suporte, etc., a maioria dos questionamentos foi respondido em 26/04/2019, mas ainda ficou um pendente para finalizar o relatório. Aguardando retorno do CNJ sobre o item faltante e nova versão para retomada dos testes.



3.3. Situação atual dos projetos do DEINF

[PE – 32408 – Estudo para solução de contingência de infraestrutura de TIC:](#) Projeto novo no portfólio. Aguardando a definição do escopo, cronograma.

3.4. Situação atual dos projetos do ASGES

[PE – 32407 – Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos:](#) Projeto novo no portfólio. Aguardando a definição do escopo, cronograma.
